




**PLANO DIRETOR DE**  
**TECNOLOGIA**  
**DA INFORMAÇÃO**  
**2019/2020**



Controladoria-Geral da União

**CGU**

Brasília, abril de 2019, atualizado em dezembro de 2019.

## **COMITÊ DE GOVERNANÇA INTERNA - CGI**

### **Ministro da Transparência e Controladoria-Geral da União**

Wagner de Campos Rosário

### **Secretário-Executivo**

José Marcelo Castro de Carvalho

### **Secretário Federal de Controle Interno**

Antônio Carlos Bezerra Leonel

### **Secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção**

Cláudia Taya

### **Secretário de Combate à Corrupção**

João Carlos Figueiredo Cardoso

### **Corregedor-Geral da União**

Gilberto Waller Junior

### **Ouvidor-Geral da União**

Valmir Gomes Dias

## **COMITÊ GERENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – CGTI**

### **Diretoria de Tecnologia da Informação**

Henrique Aparecido da Rocha · titular  
Marcelo Augusto Pimentel · suplente

### **Gabinete do Ministro**

Aurisan Souza de Santana · titular  
José Ilo Rogerio de Holanda · suplente

### **Secretaria Federal de Controle Interno**

Fábio Silva Vasconcelos · titular  
Ana Vitoria Piaggio Albuquerque · suplente

### **Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção**

Fabiana Cristina de Oliveira Fiorini · titular  
Maria de Fatima Rezende · suplente

### **Secretaria de Combate à Corrupção**

Leonardo Jorge Sales · titular  
Viviane André Antunes · suplente

### **Corregedoria-Geral da União**

Daniel Rodrigues Pelles · titular  
Fabiano Gusmão Mello · suplente

### **Ouvidoria-Geral da União**

Marcos Gerhardt Lindenmayer · titular  
Luana Marcelino · suplente

### **Controladorias-Gerais da União nos Estados**

Breno Barbosa Cerqueira Alves (CGU-MG) · titular  
Glauco Soares Ferreira (CGU-ES) · suplente

### **Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional**

Walter Luis Araujo da Cunha · titular  
Gustavo Rezende Soares · suplente

### **Diretoria de Gestão Interna**

Alessandra Lopes de Pinho · titular  
Diego Araujo de Castro · suplente

## **EQUIPE DE ELABORAÇÃO DO PDTI**

Ana Vitoria Piaggio  
Maíra Hanashiro  
Raniere Araújo de Campos  
Renata Matos  
Thais Lima de Paulo

## HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
27/03/2019	0.1	Versão inicial	Ana Vitoria Piaggio
12/04/2019	1.0	Versão atualizada	Maíra Hanashiro
22/04/2019	1.1	Versão revisada	Raniere Araújo de Campos
11/12/2019	2.0	Versão atualizada	Maíra Hanashiro

## SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO .....	5
2	ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DE TI DA CGU .....	6
3	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO .....	7
3.1	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGU .....	7
3.2	ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL.....	9
4	PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 2019-2020.....	10
5	PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS.....	12
6	PLANO DE GESTÃO DE RISCOS.....	13
7	CONCLUSÃO.....	14
	ANEXO I – CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO.....	15
	ANEXO II – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADO.....	17
	ANEXO III – PLANO DE AÇÕES E METAS .....	22
	ANEXO IV - PLANO ORÇAMENTÁRIO 2019 - 2020 .....	29

# 1 APRESENTAÇÃO

O presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI tem como propósito direcionar as ações de TI na Controladoria-Geral da União – CGU entre abril de 2019 e março de 2020, com revisão anual das ações prioritizadas com a inclusão de novos projetos inseridos no portfólio. O PDTI define os projetos a serem executados com o intuito de viabilizar o alcance dos objetivos definidos no Plano Estratégico Institucional e nos Planos Táticos e Operacionais das Unidades, bem como aqueles necessários ao adequado funcionamento dos sistemas e serviços de TI.

A elaboração, o monitoramento e a revisão do Plano Diretor de TI são parte do Processo de Planejamento de TI, o qual orienta a seleção, priorização e acompanhamento do portfólio de ações e investimentos em Tecnologia da Informação necessários ao atendimento das demandas da CGU, em alinhamento com as estratégias organizacionais.

O Planejamento de TI é conduzido pela Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI e conta com a participação da estrutura de Governança de TI do Órgão.

Este documento aborda os seguintes temas: a estrutura de Governança de TI da CGU; o alinhamento estratégico da CGU e de Governança Digital; o processo de Priorização de Projetos 2019-2020; a gestão de pessoas e de risco; o inventário de necessidades priorizado, o Plano de Ações e Metas e o Plano Orçamentário.

## 2 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DE TI DA CGU

A estrutura de **Governança de TI** do Órgão é definida pela **Política de Governança de Tecnologia da Informação – PGTI/CGU**, instituída pela Portaria 3.123/2018 e atualizada pela Portaria nº 1.420/2019, e composta pelos Comitê de Governança Interna – CGI, o Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação – CGTI e as Unidades Gestoras de Soluções de TI.

O Comitê de Governança Interna – CGI foi instituído pela Portaria CGU nº 665, de 7.2.2019, sendo composto pelos ocupantes dos cargos de Ministro de Estado; Secretário-Executivo; Secretário Federal de Controle Interno; Secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção; Secretário de Combate à Corrupção; Corregedor-Geral da União; e Ouvidor-Geral da União.

No âmbito da TI, tem como principais atribuições: estabelecer políticas, diretrizes, objetivos e metas relacionadas ao provimento, gestão e uso de TI; aprovar o planejamento de Tecnologia da Informação e a alocação dos recursos orçamentários destinados à TI; avaliar, periodicamente, a execução do planejamento de TI e a evolução dos indicadores de desempenho, de modo a reavaliar prioridades, identificar eventuais desvios e determinar correções necessárias; e deliberar sobre assuntos relativos à Governança Digital.

O Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação – CGTI foi instituído pela PGTI, sendo composto por representantes, titular e suplente, das seguintes unidades organizacionais: Gabinete do Ministro; Secretaria Federal de Controle Interno; Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção; Secretaria de Combate à Corrupção; Corregedoria-Geral da União; Ouvidoria-Geral da União; Diretoria de Tecnologia e Informação, representando a Secretaria-Executiva; Controladorias Regionais da União; Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; e Diretoria de Gestão Interna. Os atuais membros foram designados por meio da Portaria 1.421/2019.

Compete ao CGTI, dentre outras atribuições, auxiliar o CGI na execução de suas competências; coordenar e articular, no âmbito da respectiva unidade organizacional, a identificação de oportunidades de informatização de processos de trabalho e a formulação de demandas para desenvolvimento e aquisição de soluções de TI; e elaborar proposta de priorização em alinhamento com a PGTI.

As Unidades Gestoras de Soluções de TI são responsáveis pela gestão das soluções de TI que automatizam processos de trabalho sob sua responsabilidade. As Unidades Gestoras têm como principais atribuições a definição dos requisitos de soluções de TI; as decisões sobre as alterações e paradas programadas das soluções de TI; e a autorização de disponibilização de informações e concessão de bases de dados aos outros órgãos e entidades.

## 3 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação tem como principais referenciais o planejamento estratégico da CGU e a Estratégia de Governança Digital da Administração Federal – EGD.

### 3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA CGU

A estratégia institucional para o período 2016-2019 está sintetizada no Mapa a seguir:

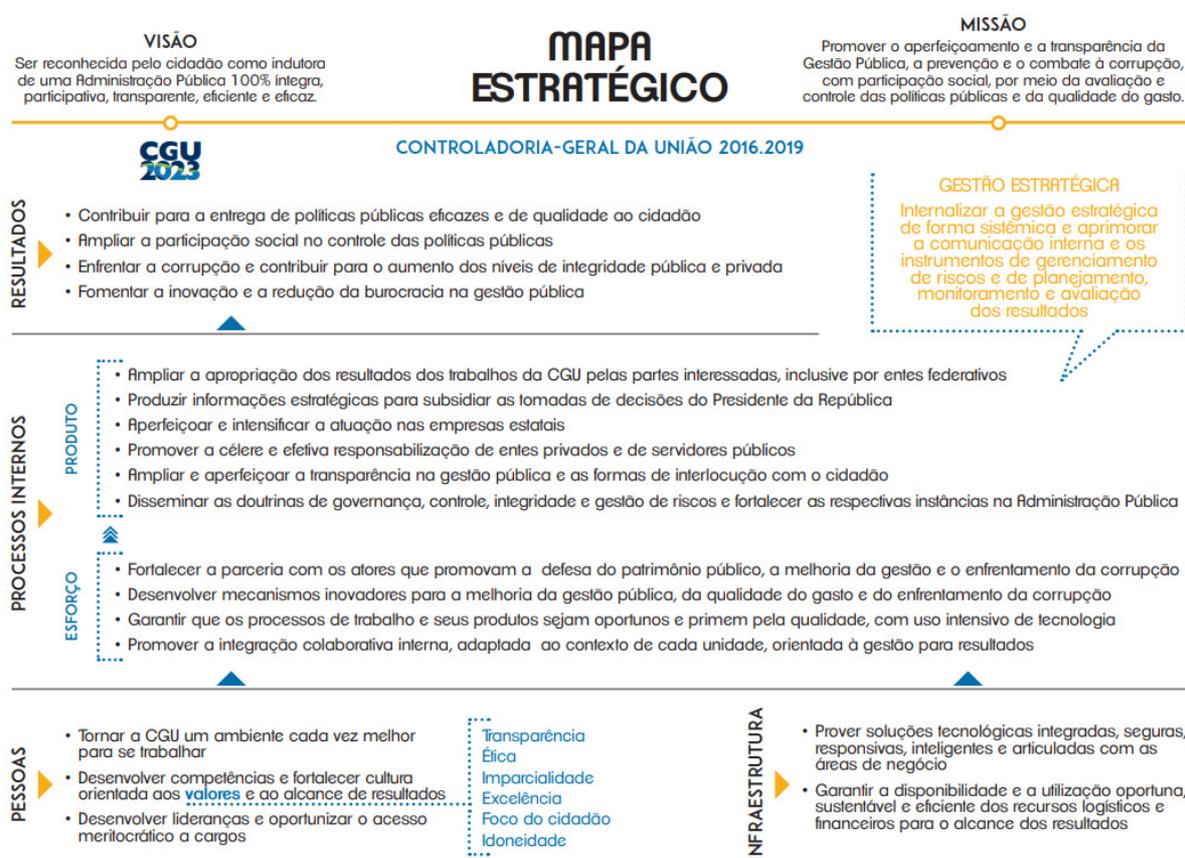


Figura 1 – Mapa Estratégico da CGU

Embora possua caráter transversal, a atuação da TI é especificamente destacada no objetivo estratégico:

*Prover soluções tecnológicas integradas, seguras, responsivas, inteligentes e articuladas com as áreas de negócio.*

Para alcance deste objetivo, foram propostas as iniciativas estratégicas a seguir:

Iniciativas Estratégicas
19.1: Aumentar o nível de maturidade da Tecnologia da Informação
19.2: Instituir e implementar processo transparente e participativo de priorização das demandas por recursos de TI
19.3: Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções com órgãos parceiros
19.5: Criar, manter, integrar e aperfeiçoar os sistemas informatizados e as soluções de TI da CGU
19.6: Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU

Tabela 1 – Iniciativas Estratégicas de Tecnologia da Informação

Os objetivos e as iniciativas estratégicas da CGU podem ser consultados no [site da CGU](#).

As iniciativas estratégicas, por sua vez, são alcançadas por meio de ações propostas no Plano Tático. Com o intuito de traçar prioridades e direcionar os esforços, as ações são agrupadas de acordo com o grau de criticidade, conforme a seguir:

Criticidade	Ações Propostas	Iniciativas Estratégicas Associadas
<b>Ações obrigatórias</b>	Governança e Gestão de TI	Iniciativa 19.1 – Aumentar o nível de maturidade da Tecnologia da Informação Iniciativa 19.2 – Instituir e implementar processo transparente e participativo de priorização das demandas por recursos de TI
	Gestão da Infraestrutura e dos Serviços de TI	Iniciativa 19.6 – Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU
<b>Ações prioritárias</b>	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	Iniciativa 19.6 – Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU
	Prospecção e provimento de soluções	Iniciativa 19.3 – Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de soluções com órgãos parceiros Iniciativa 19.5 – Criar, manter, integrar e aperfeiçoar os sistemas informatizados e as soluções de TI da CGU
<b>Ações complementares</b>	Capacitação	Iniciativa 19.1 – Aumentar o nível de maturidade da Tecnologia da Informação Iniciativa 19.5 – Criar, manter, integrar e aperfeiçoar os sistemas informatizados e as soluções de TI da CGU Iniciativa 19.6 – Infraestrutura de TI atualizada, disponível e adequada às necessidades da CGU

Tabela 2 – Ações Estratégicas de TI

### 3.2 ESTRATÉGIA DE GOVERNANÇA DIGITAL

A Estratégia de Governança Digital – EGD 2016-2019 define os objetivos estratégicos, metas e indicadores da Política de Governança Digital da administração pública federal, estabelecida pelo Decreto nº 8.638, de 15 de janeiro de 2016.

O propósito da EGD é orientar e integrar as iniciativas de transformação digital dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, contribuindo para aumentar a efetividade da geração de benefícios para a sociedade brasileira. A EGD orienta as ações do governo em três eixos principais: Acesso à informação (tendo como principal agente ativo a Controladoria-Geral da União), Prestação de serviços (sob competência do atual Ministério da Economia) e Participação Social (Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV/ PR)).

<b>Eixo</b>	<b>Objetivos Estratégicos</b>
Acesso à informação	OE.01 – Fomentar a disponibilização e o uso de dados abertos OE.02 – Promover a transparência por meio do uso de TIC
Prestação de serviços	OE.03 – Ampliar a oferta e aprimorar os serviços públicos por meio da transformação digital OE.04 – Compartilhar e integrar infraestruturas, dados, processos, sistemas e serviços
Participação social	OE.05 – Ampliar a participação social no ciclo de vida das políticas e serviços públicos

Tabela 3 – Objetivos da Estratégia de Governança Digital

## 4 PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS 2019-2020

O ciclo de planejamento 2019/2020 deu-se conforme cronograma abaixo, iniciando-se com a identificação e registro das demandas de TI das unidades organizacionais, em alinhamento com os objetivos e iniciativas estratégicas institucionais:



Nesta primeira etapa, 49 demandas foram apresentadas à área de TI, que as avaliou com o intuito de identificar convergências e interseções. Este processo contou com a participação direta das unidades demandantes, convidadas a expor e avaliar previamente as necessidades com um olhar mais amplo, considerando-as no contexto da CGU e observando as interações entre as áreas.

Na etapa seguinte ocorreu a avaliação técnica das necessidades, com a proposição, pela área de TI, de alternativas de solução e análise dos riscos, esforço e custos envolvidos. Tais proposições foram registradas em pareceres técnicos, avaliados de forma conjunta com as respectivas Áreas de Negócio, com o intuito de alinhar o entendimento e acordar o projeto de solução que melhor atenda aos requisitos técnicos e negociais.

Dessa etapa, resultaram 33 propostas de projetos, que foram submetidas à apreciação pelo Comitê Gerencial de TI – CGTI. Com base em critérios preestabelecidos de relevância, risco e urgência (apresentados no Anexo I deste documento), e levando em consideração a análise técnica e a capacidade operacional da TI, o CGTI elaborou sua proposta de priorização de projetos, visando identificar os projetos com maior potencial de entrega de valor para a CGU. A proposta foi então submetida à deliberação do Comitê de Governança Interna – CGI.

O portfólio de projetos, balanceado pelo CGI com base nos objetivos estratégicos, prioridades da CGU e observando os recursos disponíveis, dentre outros aspectos, está inserido no Anexo II deste plano.

A execução do portfólio aprovado cabe à Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, a quem compete, em consonância com o Decreto nº 9.681, de 03 de janeiro de 2019, disponibilizar e incentivar o uso de soluções de tecnologia e sistemas de informação, bem como orientar e disciplinar sua utilização no âmbito da CGU, visando a melhoria da eficiência operacional, dos processos de gestão e das ferramentas de trabalho.

O Plano de Ações e Metas – PAM (Anexo III) distribui os projetos priorizados e aqueles remanescentes do PDTI 2018-2019 de acordo com as cestas de execução baseadas nas tecnologias envolvidas e nas equipes disponíveis na Diretoria, obedecendo à ordem de priorização acordada e a capacidade de execução da DTI.

Além disso, o PAM apresenta as estimativas de data de início e fim dos projetos acordadas junto ao CGI, as quais poderão ser alteradas durante o exercício, dando-se ciência ao Comitê no processo de acompanhamento de execução do PDTI.

## 5 PLANO DE GESTÃO DE PESSOAS

A Política de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores da CGU foi instituída pela Portaria nº 2.217, de 17 de outubro de 2017, e tem como principal instrumento o Plano Anual de Capacitação. O Plano estabelece orientações voltadas à execução de ações e eventos de capacitação e desenvolvimento das pessoas da CGU com vistas ao incremento de competências aderentes ao Planejamento Estratégico da CGU. O documento abrange inclusive as avaliações realizadas pelos servidores sobre as suas próprias necessidades de capacitação.

As ações de desenvolvimento profissional na CGU são realizadas, avaliadas e disseminadas conforme necessidades e demandas dos servidores, gestores e unidades da CGU, tendo por referencial:

- as atividades laborais, formação acadêmica e experiência profissional do servidor;
- as lacunas de competências apontadas no Modelo de Gestão por Competências da CGU, propiciando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores relevantes para o cumprimento da missão institucional do órgão;
- os planos operacionais existentes nas unidades da CGU, que materializam as ações a serem realizadas no exercício e contribuem para o alcance da missão, visão e dos objetivos estratégicos;
- a oportunidade e utilidade do evento de capacitação para a unidade de exercício do servidor.

A indicação da classificação da prioridade de competência e o alinhamento ao Plano Operacional da Unidade subsidiam a análise dos dirigentes quanto à harmonização entre o que é solicitado pelo servidor e a necessidade de atendimento das lacunas de competências da sua unidade de lotação/exercício, bem como sua integração aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico da CGU vigente, com o intuito de racionalizar os recursos e atender a Política de Capacitação e Desenvolvimento do Ministério.

No Plano Tático de TI, as ações de capacitação de pessoal aparecem como ações complementares.

## 6 PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Em 10 de maio de 2016, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) publicaram a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, que dispõe sobre a sistematização de práticas relacionadas à governança, à gestão de riscos e aos controles internos no âmbito de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Em abril de 2017, em consonância com a IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016, a CGU publicou a Política de Gestão de Riscos (PGR) na Portaria nº 915/2017, que estrutura os processos da gestão de riscos, com o alinhamento aos planejamentos estratégico, tático e operacional, considerando também as características específicas e a cultura organizacional.

A Portaria nº 910, de 3 de abril de 2018, aprova a Metodologia de Gestão de Riscos da CGU, que se fundamenta em normas técnicas (tais como ABNT NBR ISO 31000:2009 e COSO-ERM), na IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016, na Política de Gestão de Riscos da CGU e em boas práticas. Conforme previsto na Metodologia, o gerenciamento de riscos deverá ser implementado de forma gradual em todas as áreas da CGU, sendo priorizados os processos organizacionais que impactam diretamente no atingimento dos objetivos estratégicos definidos no Planejamento Estratégico da CGU. As unidades organizacionais deverão elaborar Plano de Gestão de Riscos também deve contemplar os Planos de Tratamento nos processos de gerenciamento de riscos e, após aprovação, ser integrado ao Plano Operacional Anual da unidade, conforme diretrizes previstas na Portaria nº 2.735/2018.

## 7 CONCLUSÃO

O monitoramento do PDTI compete à Diretoria de Tecnologia da Informação, que acompanhará a execução e os resultados do PDTI, para identificação da necessidade de ajustes ou de medidas mitigadoras e apresentará ao Comitê de Governança Interna, trimestralmente, ou quando solicitado, o resultado de alcance das ações previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

O PDTI será revisto a qualquer tempo no decorrer do período de vigência, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajuste. Propostas de ajuste deverão ser submetidas ao Diretor de Tecnologia da Informação para exame e, quando for o caso, encaminhamento ao Comitê de Governança Interna, para deliberação.

## ANEXO I – CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO

A proposta de priorização dos projetos de TI apreciada pelo Comitê de Governança Interna é subsidiada por meio de um sistema de pontuação, no qual o Comitê Gerencial de Tecnologia da Informação avalia os aspectos considerados nos critérios de classificação.

Cada membro do CGTI preenche os valores dos critérios em cada demanda. A pontuação da demanda é dada pelo somatório dos valores atribuídos a cada critério.

Ao final do processo, ter-se-á a relação de demanda de TI ordenada da maior pontuação para a menor, compondo a proposta de Plano de Ações e Metas de TI que, após deliberação do CGI, fará parte do PDTI.

Os critérios de classificação estão reunidos em 3 (três) domínios: relevância, risco e urgência. A cada domínio foi atribuído um certo quantitativo de pontos, de acordo com o seu grau de importância para a CGU, conforme entendimento do CGI, totalizando 100 (cem) pontos. Os critérios são os seguintes, acompanhados de sua gradação:

Critério	Descrição	Item de Avaliação	Valor	Pontuação Máxima	
<b>Relevância</b>	<b>Resultados Externos</b>	Alto	15	<b>15</b>	
		Médio	10		
		Baixo	5		
		Irrelevante	0		
	<b>Resultados Internos</b>	Alto	15	<b>15</b>	
		Médio	10		
		Baixo	5		
		Irrelevante	0		
	<b>Público Alvo</b>	Parcela da sociedade ou do governo beneficiada pelo projeto.	Resultados atingem toda a sociedade	10	<b>50</b>
			Resultados atingem mais de uma esfera de governo	6	
			Resultados atingem todo o Poder Executivo	3	
			Resultados atingem somente a CGU	0	
	<b>Alinhamento Estratégico</b>	Vínculo com o Planejamento Estratégico	Vínculo com Objetivo / Iniciativa / Indicador / Meta / PPA	5	<b>5</b>
Vínculo com Objetivo / Iniciativa / Indicador / Meta /			2		
Vínculo com Objetivo / Iniciativa			1		

			Vínculo com Objetivo Estratégico	0		
<b>Risco</b>	<b>Riscos de Negócio</b>	Probabilidade de insucesso do projeto decorrente de fatores associados a área de negócio ou de externalidades, tais como maturidade de requisitos, exposição da imagem, ou baixa dependência de órgão externos.	Muito alto	0	<b>10</b>	<b>20</b>
			Alto	3		
			Médio	6		
			Baixo	10		
	<b>Riscos de TI</b>	Grau de dificuldade de execução do projeto, considerado aspectos inerentes a TI, tais como aderência a tecnologias e padrões da CGU e complexidade na aquisição ou desenvolvimento. Quanto menor o risco, maior a pontuação.	Muito alto	0	<b>10</b>	
			Alto	3		
			Médio	6		
			Baixo	10		
<b>Urgência</b>	Existência obrigações da CGU impostas por norma legal ou assumidas em decorrência de acordos ou compromissos, ponderando-se o prazo. Também deve ser considerado eventual risco de impossibilidade de adoção da solução em momento futuro.	Alta	30	<b>30</b>		
		Média	15			
		Baixa	5			
		Inexistente	0			
			<b>TO-TAL</b>		<b>100</b>	

## ANEXO II – INVENTÁRIO DE NECESSIDADES PRIORIZADO

Unidade Demandante	Código PO	Título da demanda	Descrição	Posição Ranking CGTI
GM	<a href="#">#93187</a>	Sistema dos Acordos de Leniência	Desenvolvimento de um sistema que permita gerenciar os acordos de leniência celebrados pela CGU.	<b>1</b>
STPC	<a href="#">#94934</a>	Contratação: Solução DW p/ m/ performance Portal da Transparência	A solução do Teradata adotada para o novo Portal da Transparência não atende aos requisitos de negócio, nem quanto ao tempo de resposta, nem quanto a abrangência das consultas, que precisaram ser restringidas por causa da limitação de infraestrutura.	<b>2</b>
OGU	<a href="#">#95624</a>	Fala.br: Sistema Integrado de ouvidoria e acesso à informação	Projeto para unificação dos sistemas e-SIC (Lei de Acesso a Informação) e e-Ouv (Ouvidoria) com login único para o cidadão e interface única para servidores e usuários externos.	<b>3</b>
SFC	<a href="#">#94020</a>	Contratação: Ferramenta de BI – DTI	Contratação da ferramenta de BI definida por meio de estudo da DTI para atendimento de demanda da SFC de criação de painéis gráficos.	<b>4</b>
OGU	<a href="#">#93638</a>	Triagem, distribuição e trâmite interno (Devido à dependência, deve ser executado junto ao projeto #95624.)	Trata-se de projeto de ampliação e adequação do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal e-Ouv, oferecido como serviço às ouvidorias na Rede Nacional de Ouvidorias. Contempla melhorias relacionadas a triagem, distribuição e a tramitação das manifestações de usuários de serviços públicos e pedidos de acesso a informação, recebidas pelas áreas dos órgãos, visando um melhor controle do trabalho desenvolvido pelas Ouvidorias.	<b>5</b>
SFC	<a href="#">#99586</a>	Internalização do Macros	O Sistema Macros consiste em uma ferramenta criada com o objetivo de concentrar, em um único sistema, os dados de interesse para a execução das ações de controle, tornar mais eficiente e abrangente o processo de levantamento de dados e eliminar a necessidade de conhecimentos especializados de acesso a bases de dados.	<b>6</b>
STPC	<a href="#">#94937</a>	Publicação das Notas Fiscais Eletrônicas	Disponibilização dos dados das notas fiscais eletrônicas, por meio de consulta no Portal da Transparência e criação de API.	<b>7</b>
SE	<a href="#">#94281</a>	Internalização do Sistema de Registo de Frequência (Ponto Eletrônico) – Sistema SIGRH	Internalização do Sistema atualmente em uso pela CGU para o controle de frequência de todos os servidores do órgão.	<b>8</b>
SCC	<a href="#">#93184<sup>1</sup></a>	Contratação: Expansão do Storage	Expansão de storage para subsidiar a internalização e gestão de todas as bases do Banco de Dados Interativo da CGU pela Unidade.	<b>9</b>
OGU	<a href="#">#95619</a>	Plataforma de enquetes do Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas	Trata-se de plataforma web para a criação e divulgação de enquetes voltadas à avaliação de serviços e políticas públicas no âmbito do Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas, para uso da CGU e de usuários externos.	<b>10</b>
CRG	<a href="#">#99646</a>	e-PAD – Implementação	Atualmente os sistemas que compõem o SISCOR (CGUPad + CGUPJ) armazenam de forma estruturada apenas informações gerenciais sobre os processos disciplinares instaurados nos órgãos	<b>11</b>

<sup>1</sup> Atualização de setembro de 2019: Cancelado pelo demandante.

			utilizadores. Propõe-se que o sistema possua funcionalidade para a criação de peças processuais com o objetivo de se obter mais informações de forma estruturada, que normalmente são encontradas em arquivos anexados ao processo e de difícil sistematização.	
STPC	<a href="#">#95907<sup>2</sup></a>	Contratação: Plataforma de EAD	Contratação de plataforma de ensino à distância para disponibilização de cursos do Programa Um por Todos.	<b>12</b>
OGU	<a href="#">#93640</a>	Plataforma de apoios para manifestações de Ouvidoria	Trata-se de plataforma que replica manifestações de ouvidoria do tipo reclamação e solicitação de simplificação, em que outros usuários poderão filtrar por temas, serviços e órgãos, e endossá-las por meio de ferramenta do tipo (like/deslike). Por vezes, as manifestações do Simplifique! São de interesse comum e esta ferramenta permitirá que os usuários de serviços públicos apoiem uma manifestação existente, evitando assim o registro de uma nova manifestação.	<b>13</b>
SE	<a href="#">#94597</a>	Contratação: Serviço de mentoring para aprimorar a Governança de Dados	Estudo sobre a atual situação da governança de dados na CGU, incluindo apoio técnico especializado, bem como apresentação de proposta de modelo operacional para a Governança dos Dados.	<b>14</b>
CRG	<a href="#">#99653</a>	CRG Digital – Implementação	Com o intuito de se reduzir o tempo médio gasto para conclusão de um procedimento disciplinar, propõe-se a criação de um ambiente integrado que promova o aumento da produtividade dos servidores e da gestão do trabalho desenvolvido.	<b>15</b>
SCC	<a href="#">#93136</a>	Contratação: Software forense investigativo	A aquisição de software investigativo com o objetivo de prover à Unidade a capacidade para lidar com grandes volumes de dados, realidade verificada nas últimas demandas, assim como permitir investigações mais apuradas sobre os dados coletados.	<b>16</b>
CRG	<a href="#">#93632</a>	Integração dos sistemas SIRCAD e SICAF (MP)	Os sistemas SICAF (ME) e SIRCAD (CGU) estão com competências sobrepostas, exigindo que os usuários cadastrem as informações duplamente.	<b>17</b>
SFC	<a href="#">#99581</a>	Central de Serviços	O eAUD será o sistema de informação para todo o processo de auditoria da SFC, havendo a necessidade de uma Central de Atendimento para os seus usuários externos.	<b>18</b>
SE	<a href="#">#93327</a>	Atualização Sistema DSPace (Base de Conhecimento da CGU)	Projeto de expansão da Base de Conhecimento, sistema DSPace, prevendo a integração da Base ao Portal das Ouvidorias.	<b>19</b>
GM	<a href="#">#100199</a>	Migração dos sites da CGU	Migração e atualização dos sites institucionais para o novo Portal Padrão do Governo Federal.	<b>20</b>
GM	<a href="#">#99521</a>	Contratação: Software de Edição Gráfica	Aquisição de ferramenta de software de edição gráfica para apoio nas áreas de criação da ASCOM (publicitária, internet, redes sociais e audiovisual).	<b>21</b>
SE	<a href="#">#93309</a>	Atualização Sistema PGD	Desenvolvimento/manutenção do sistema que gerencia o Programa de Gestão de Demandas, a fim de expandir as atuais funcionalidades.	<b>22</b>
SFC	<a href="#">#94009</a>	Contratação: Câmeras e headsets	Aquisição de câmeras e headsets para uso por todos os servidores da SFC, de Brasília e Regionais.	<b>23</b>
SE	<a href="#">#93698</a>	Escritório Digital 2.0	Segunda etapa do projeto Escritório Digital, tem como foco empoderar ainda mais os usuários da Casa com ferramentas que auxiliem os trabalhos.	<b>24</b>
SCC	<a href="#">#93193</a>	Contratação: Software forense extração/decodificação/análise dados dispositivos digitais	Aquisição para incrementar os recursos técnicos da DIE no que tange à sua atribuição regimental de execução de atividades de análise forense computacional.	<b>25</b>
SFC	<a href="#">#93994</a>	Contratação: software de data science, eDiscovery e estatística	Aquisição de software, servidor de armazenamento, servidor de aplicação e ações de capacitação de ferramenta especializada em data science, eDiscovery e estatística.	<b>26</b>

SE	<a href="#">#93696</a>	Internalização do Desenvolvimento do Sistema IARA	Projeto para registro e gestão da internalização do desenvolvimento do sistema IARA pela DTI.	<b>27</b>
SE	<a href="#">#94599</a>	Contratação: Cliente para Teradata	Realização de estudo técnico com o objetivo de identificar e adquirir um cliente com melhor usabilidade para os usuários da CGU que precisam conectar no Teradata.	<b>28</b>
CRG	<a href="#">#99648</a>	Nacionalização do CGUPad + CGUPJ – Implementação	Adaptação do SISCOR (CGUPad + CGUPJ) para que seja utilizável não somente pelas unidades do Poder Executivo Federal, mas também pelos Estados e Municípios da Federação que se interessem na ferramenta para gestão da atividade correcional em seu âmbito.	<b>29</b>
GM	<a href="#">#100387</a>	Sistema de Acompanhamento Parlamentar – CGULegis	Desenvolvimento de sistema informatizado para atender as necessidades de acompanhamento das atividades do Congresso Nacional.	<b>30</b>
SFC	<a href="#">#99577</a>	Contratação: Software para Análise de Dados	Aquisição de software de análise estatística para subsidiar trabalhos dessa natureza.	<b>31</b>

<sup>2</sup> Atualização de outubro de 2019: Cancelado pelo demandante.

## Projetos adicionados durante a vigência do Plano:

Unidade Demandante	Código PO	Título da demanda	Descrição	Justificativa
STPC	<a href="#">#105203</a>	Sistema de Agenda de Compromissos Públicos	Sistema que possibilite o registro de informações sobre pedidos de marcação de compromissos públicos (audiências, reuniões etc.) de autoridades, sua aceitação ou não, além do registro de compromissos na agenda (previamente ou após ocorrido o compromisso), conforme dispõe o art. 11 da Lei 12.813/2013.	Inserido por meio de deliberação do CGI em 10.5.2019.
DIPLAD	<a href="#">#92305</a>	Contratação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos	Aquisição de sistema de informação e contratação de serviços profissionais especializados para sua customização, a fim de aumentar e aperfeiçoar a governança e a gestão estratégica da Controladoria-Geral da União, por meio do planejamento e execução dos projetos e atividades, assim como pelo acompanhamento e avaliação dos objetivos estratégicos e indicadores do Planejamento Estratégico.	Aquisição decorrente do resultado do estudo #84524 Planejamento estratégico – Ferramenta de gestão PO-CGU (projeto remanescente do PDTI 2018-2019).
SFC	<a href="#">#106731</a>	Desenvolvimento de Funcionalidades do E-TCE	Continuidade da parceria firmada com entre o Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União (CGU) para o desenvolvimento de novas funcionalidades no Sistema de Tomada de Contas Especial (Sistema e-TCE), de acordo com as necessidades de gestão do Controle Interno. Nesta parceria, a DTI participa por	Trata-se de solicitação realizada pelo TCU por meio do Ofício 0010/2019-TCU/Segecex, em 26/04/2019.

			meio da disponibilização de um servidor para trabalhar como desenvolvedor no projeto.	
SE	<a href="#">#97620</a>	Projeto FDD - Ambiente virtual de trabalho para proteção das informações de controle governamentais	O objetivo deste projeto é implantar solução de ambiente virtual de trabalho que possibilite acesso controlado independente do local físico do servidor.	Inserido após a celebração do Termo de Execução Descentralizada FDD N° 23/2019, entre o Ministério da Justiça e a Controladoria-Geral da União. O projeto terá duração de três anos. No exercício atual, serão executados os subprojetos #97627 - Benchmarking da solução VDI e #84597 - Estudo sobre desktops virtuais (VDI).
SFC	<a href="#">#779791</a>	Aprovação de procedimento para utilização de drones pela CGU	Trata-se subatividade de aquisição de software de processamento e modelagem 2D e 3D baseada em imagens aéreas para realizar o processamento das imagens obtidas por Drone.	A necessidade de contratação foi identificada durante o projeto e será conduzida pela própria SFC a fim de atingir os objetivos do projeto #779791.
SE	<a href="#">#801286</a>	Cadastro de Obras do Governo Federal	Trata-se de apoio ao Ministério da Economia - ME para construção do Cadastro de Obras do Governo Federal, cadastro único com a finalidade de identificar e agregar dados acerca das obras implementadas com recursos federais.	O apoio da CGU se dará por meio da Rede +Brasil, através do Acordo de Cooperação Técnica no. 04/2015, e a participação da DTI está autorizada pelo Secretário-Executivo. A participação da CGU se dará pelo compartilhamento do contrato administrativo de serviços de Tecnologia da Informação.
STPC	<a href="#">#800775</a>	Portal de Dados Abertos	Trata-se de internalização do Portal de Dados Abertos, o qual era mantido pelo Ministério da Economia.	A internalização do Portal de Dados Abertos ocorrerá no lugar do projeto "#95907 - Contratação: Plataforma de EAD" no calendário do PDTI 2019/2020, de acordo com solicitação da STPC e anuência do Secretário Executivo. O projeto é prioridade, visto que a política de Dados Abertos veio para a CGU em julho, por força do Decreto 9.903/2019.
DGI	<a href="#">#808285</a>	Contratação de Serviços de Digitalização e indexação de processos de papéis de trabalho de auditoria e fiscalização da Controladorias Regionais	O objetivo é contratar solução para ordenar e racionalizar o acervo para proporcionar inteligibilidade e dinamismo ao acesso a documentos, bem como, proporcionar a aplicação dos códigos de classificação e tabelas de temporalidade da área-fim e, consequentemente, realizar com segurança a identificação dos subfundos, proporcionando destinação final com alto grau de precisão.	Por orientação do setor jurídico, a contratação passou a ser considerada um serviço de TI, surgindo a necessidade de seguir o processo da IN N° 1 (contratação de soluções de TIC).
REGIONAIS, DIE e DTI	<a href="#">#810801</a>	Aquisição de Dispositivos de Usuários	Trata-se de aquisição de dispositivos de microinformática para usuários e que possuem especificações simplificadas como exemplos: pendrives, HD externos e internos, scanners de mesa e de mão, suprimentos de equipamentos de microinformática, teclado e mouse com ou sem fio e outros.	Tratam-se, a princípio, de necessidades pontuais identificadas pelas Unidades Regionais, as quais serão realizadas de forma descentralizada, no entanto, as áreas da Sede também podem ter essa necessidade.
DTI	<a href="#">#810803</a>	Aquisição de Componentes de Infraestrutura	Trata-se de aquisição de componentes de infraestrutura de redes, tais como monitores KVM para rack 19, circuitos ópticos, cordão	Essa aquisição surgiu devido ao aumento inesperado de utilização de recursos do Datacenter da

			óptico, patch-cord CAT6 de diferentes tamanhos e outros itens de interligação de equipamentos de rede.	CGU, consumindo parte dos componentes de infraestrutura que se encontrava no estoque.
--	--	--	--	---

## ANEXO III – PLANO DE AÇÕES E METAS

Com base nos temas previstos no Plano Tático, são propostas as ações e metas de tecnologia da informação para o período 2019/2020. Importante registrar que este plano de ações e metas não relaciona iniciativas de gestão, operação e manutenção dos serviços de TI em funcionamento, às quais é destinado um percentual da capacidade total de tecnologia, com prioridade definida pela área de tecnologia da informação.

De forma análoga, um percentual da capacidade total de desenvolvimento de sistemas é alocado para atividades de sustentação de soluções, cujas prioridades são definidas de forma dinâmica pelas áreas gestoras das soluções de tecnologia da informação.

Também não constam neste plano as ações de capacitação de servidores, que são definidas conforme as diretrizes do Plano Anual de Capacitação da CGU.

### Cesta: Desenvolvimento Interno (.NET)

ID <sup>2</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Início	Término	Área de Negócio
#95624 #93638	Fala.br: Sistema Integrado de ouvidoria e acesso à informação + Triagem, distribuição e trâmite interno	9.2 / 9.3 / 9.5 / 9.9	OE.05	Prospecção e provimento de soluções	29/04/2019	23/10/2020	OGU
#99646	e-PAD – Implementação	8.1 / 8.4	OE.03	Prospecção e provimento de soluções	29/04/2019	21/08/2020	CRG
#93187	Sistema dos Acordos de Leniência (Etapa 2 – Integrações)	-	-	Prospecção e provimento de soluções	06/01/2020	29/05/2020	SCC
#93632	Integração dos sistemas SIRCAD e SICAF (MP) <sup>3</sup>	8.1 / 8.4 / 8.10	-	Prospecção e provimento de soluções			CRG
#93309	Atualização Sistema PGD <sup>3</sup>	15.3 / 17.4 / 19.5	OE.02	Prospecção e provimento de soluções			SE/DIPLAD
#93696	Internalização do Desenvolvimento do Sistema IARA <sup>3</sup>	19.5	OE.05	Prospecção e provimento de soluções			SE

<sup>2</sup> Código referente ao subprojeto no Plano Operacional- PO da CGU.

<sup>3</sup> Demandas que extrapolam a capacidade operacional disponível no período de vigência do PDTI.

#99648	Nacionalização do CGUPad + CGUPJ – Implementação <sup>2</sup>	8.1 / 8.4	OE.03 / OE.04	Prospecção e provimento de soluções			CRG
--------	---	-----------	---------------	-------------------------------------	--	--	-----

**Cesta: Desenvolvimento Interno (Java I)**

ID <sup>1</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Início	Término	Área de Negócio
#88741	Sistema de Gestão das Operações Especiais (projeto remanescente do PDTI 2018-2019)	-	-	Prospecção e provimento de soluções	08/04/2019	17/05/2019	SFC
#84397	Mapa Brasil Transparente (projeto remanescente do PDTI 2018-2019)	-	-	Prospecção e provimento de soluções	20/05/2019	11/10/2019	STPC
#99586	Internalização do Macros	19.5	-	Prospecção e provimento de soluções	14/10/2019	14/02/2020	SFC
#94937	Publicação das Notas Fiscais Eletrônicas (Parte 2)	9.3	OE.01 / OE.02	Prospecção e provimento de soluções	17/02/2020	27/03/2020	STPC
#94281	Internalização do Sistema de Registo de Frequência (Ponto Eletrônico) – Sistema SIGRH	13.2	OE.02 / OE.04	Prospecção e provimento de soluções	30/03/2020	10/07/2020	SE/DGI

**Cesta: Desenvolvimento Interno (Java II)**

ID <sup>1</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Início	Término	Área de Negócio
#84502	Eaud – Etapas 02 (Execução da Auditoria) e 03 (Abertura do Monitor para CISETs) (projeto remanescente do PDTI 2018-2019)	-	-	Prospecção e provimento de soluções	08/04/2019	19/07/2019	SFC
#93187	Sistema dos Acordos de Leniência (Etapa 1)	-	-	Prospecção e provimento de soluções	22/07/2019	14/02/2020	SCC
#95619	Plataforma de enquetes do Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas	9.2 / 9.3 / 9.5 / 9.9	OE.05	Prospecção e provimento de soluções	14/10/2019	24/01/2020	OGU
#93640	Plataforma de apoios para manifestações de ouvidoria	9.2 / 9.3 / 9.5 / 9.9	OE.02	Prospecção e provimento de soluções	17/02/2020	17/04/2020	OGU
#100387	Sistema de Acompanhamento Parlamentar – CGULegis <sup>2</sup>	8.6 / 15.1	-	Prospecção e provimento de soluções			GM

<sup>1</sup> Código referente ao subprojeto no Plano Operacional- PO da CGU.<sup>2</sup> Demandas que extrapolam a capacidade operacional disponível no período de vigência do PDTI.

**Cesta: Prospecção de Soluções**

ID <sup>1</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Início	Término	Área de Negócio
#84524	Estudo – Planejamento estratégico – Ferramenta de gestão PO-CGU (projeto remanescente do PDTI 2018-2019)	-	-	Prospecção e provimento de soluções	08/04/2019	19/07/2019	SE/DIPLAD
#99653	CRG Digital – Implementação	8.1 / 8.4	OE.03	Prospecção e provimento de soluções	22/07/2019	24/01/2020	CRG
#800775	Portal de Dados Abertos	9.1	-	Prospecção e provimento de soluções	27/01/2020	27/03/2020	STPC
#93327	Atualização Sistema DSPace (Base de Conhecimento da CGU) <sup>2</sup>	14.2 / 15.3 / 17.4 / 19.5	OE.01 / OE.04	Prospecção e provimento de soluções			SE/DIPLAD
#100199	Migração dos sites da CGU <sup>2</sup>	5.1	OE.01 / OE.03	Prospecção e provimento de soluções			GM/ASCOM
#93698	Escritório Digital 2.0 <sup>2</sup>	19.5	OE.04 / OE.05	Prospecção e provimento de soluções			SE/DTI

**Cesta: Banco de Dados e BI**

ID <sup>1</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Início	Término	Área de Negócio
#94934	Contratação: Solução DW p/ m/ performance Portal da Transparência (Especificação)	-	OE.01 / OE.02	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	08/04/2019	09/08/2019	STPC
#94020	Contratação: Ferramenta de BI – DTI (Especificação)	5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6.1 / 6.3 / 7.8 / 8.8. / 9.2 / 9.4 / 9.5 / 10.5 / 12.1-A / 12.1-B / 13.1 /	OE.01 / OE.02 / OE.04 / OE.05	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	08/04/2019	09/08/2019	SFC

<sup>1</sup> Código referente ao subprojeto no Plano Operacional- PO da CGU.<sup>2</sup> Demandas que extrapolam a capacidade operacional disponível no período de vigência do PDTI.

		13.2 / 15.3 / 19.1 / 19.5					
#94937	Publicação das Notas Fiscais Eletrônicas (Parte 1)	9.3	OE.01	Prospecção e provimento de soluções	29/04/2019	31/03/2020	STPC
#94597	Contratação: Serviço de mentoring para aprimorar a Governança de Dados (Especificação)	19.1	OE.01 / OE.04	Governança e Gestão de TI	22/07/2019	01/11/2019	SE/DTI
#94599	Contratação: Cliente para Teradata (Especificação)	19.5	-	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	04/11/2019	03/01/2020	SE/DTI

**Cesta: Infraestrutura**

ID <sup>1</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Início	Término	Área de Negócio
#99528	Gestão do Credenciamento de Usuários de Sistemas	19.5	OE.04	Governança e Gestão de TI	08/01/2019	19/08/2019	SE/DTI
#84582	Implantação da Rede Wan (projeto remanescente do PO 2018-2019)	19.6	-	Gestão da Infraestrutura e dos Serviços de TI	05/11/2018	30/09/2019	SE/DTI
#97636	Mudança para Colocation Sede	19.6	OE.04	Gestão da Infraestrutura e dos Serviços de TI	01/06/2019	31/08/2019	SE/DTI
#84597	Projeto FDD - Estudo sobre desktops virtuais (VDI) (projeto remanescente do PDTI 2018-2019)	19.6	-	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	01/03/2019	05/09/2019	SE/DTI
#99581	Central de Serviços	5.1 / 5.2 / 10.2	-	Prospecção e provimento de soluções	07/06/2019	08/10/2019	SFC
#105021	Implantação da ferramenta de Graylog em Ambiente de Produção	19.6	-	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	30/04/2019	25/10/2019	SE/DTI
#97639	Implantação do Serviço de Nuvem	19.6	OE.03	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	01/08/2019	20/01/2019	SE/DTI

**Cesta: Contratações**

O estabelecimento de metas para o portfólio de projetos de contratação está vinculado à disponibilidade orçamentária do órgão. As necessidades de contratação estão inseridas na tabela a seguir:

#	ID <sup>1</sup>	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Área de Negócio
1	#94934	Contratação: Solução DW p/ m/ performance Portal da Transparência		OE.01 / OE.02 / OE.05	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	STPC
2	#94020	Contratação: Ferramenta de BI – DTI		OE.01 / OE.02 / OE.04	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	SFC
3	#95907	Contratação: Plataforma de EAD <sup>3</sup>	9.1		Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	STPC
4	#94597	Contratação: Serviço de mentoring para aprimorar a Governança de Dados	19.1 / 19.5	OE.01 / OE.04	Governança e Gestão de TI	DTI
5	#99653	CRG Digital – Implementação	8.1 / 8.4	OE.03	Prospecção e provimento de soluções	CRG
6	#93136	Contratação: Software forense investigativo	12.4		Prospecção e provimento de soluções	SCC
7	#99521	Contratação: Software de Edição Gráfica	5.1		Prospecção e provimento de soluções	ASCOM
8	#94009	Contratação: Câmeras e headsets			Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	SFC
9	#93193	Contratação: Software forense extração/decodificação/análise dados dispositivos digitais	12.4		Prospecção e provimento de soluções	SCC
10	#93994	Contratação: software de data science, eDiscovery e estatística - DTI		OE.04	Prospecção e provimento de soluções	SFC
11	#94599	Contratação: Cliente para Teradata (especificação)	19.5	OE.01 / OE.03 / OE.04	Modernização da Infraestrutura e dos Serviços de TI	DTI
12	#99577	Contratação: Software para Análise de Dados			Prospecção e provimento de soluções	SFC
13	#92305	Contratação: Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Projetos	15.3 / 15.7 / 19.5		Prospecção e provimento de soluções	DIPLAD
14	#779791	Aprovação de procedimento para utilização de drones pela CGU (aquisição de software de processamento e modelagem 2D e 3D baseada em imagens aéreas para realizar o processamento das imagens obtidas por Drone)	16.4 / 19.6		Prospecção e provimento de soluções	SFC

<sup>3</sup> Cancelado para inserção do projeto #800775 – Portal de Dados Abertos.

**Contratações de Sustentação da TI**

Seguem abaixo as contratações que suportam a sustentação de soluções de TI já implementadas na CGU:

#	ID	Título da Demanda	Iniciativas Estratégicas	EGD	Ação no Plano Tático	Área de Negócio
1	#93648	Renovação de Serviço: Serviço Especializado Teradata (CT 34/2018)	19.6	OE.02	Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
2	#93650	Renovação de Serviço: Serviço DW (CT 016/2018)	19.6	OE.02	Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
3	#93652	Renovação de Serviço: Desenvolvimento e Manutenção de Painéis (CT 41/2017)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
4	#93654	Contratação: Suporte e Atualização MySql (CT36/2017)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
5	#94500	Contratação: Servidores de Rede tipo rack (CT34/2014)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
6	#94502	Renovação Serviço: Suporte e Atualização Virtualização (CT 28/2016)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
7	#94504	Contratação: Serviço de Nuvem	19.6	OE.03	Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
8	#94506	Renovação Serviço: Solução de Backup (CT 46/2017)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
9	#94520	Renovação Serviço: Outsourcing de Impressão DF e Estados (CT MF 901/2016)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
10	#96140	Renovação Serviço: Suporte Solução Rede Wifi (CT001/2014)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
11	#96145	Renovação Serviço: Licenciamento Microsoft (CT7/2017)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
12	#96158	Renovação Serviço: Certificado A3	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
13	#96160	Renovação Serviço: Premier Microsoft	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
14	#96179	Renovação Serviço: Certificados A1	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
15	#96183	Renovação Serviço: Suporte e Atualização licenças Qlikview (CT042/2015)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
16	#96202	Contratação: Moving Datacenter SEDE	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
17	#96204	Contratação: Serviço Colocation Datacenter SEDE	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
18	#96206	Contratação: Suporte do Storage V7000	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
19	#99066	Contratação: Fitas Fitoteca LTO-7 (CT33/2018)	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
20	#93706	Contratação: Apoio Técnico à Prospecção de Soluções	19.6	OE.03	Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI

21	#94522	Contratação: Suporte Especializado HPSM	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
22	#104886	Contratação: Notebooks	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
23	#104883	Contratação: Computadores Desktops	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
24	#94593	Contratação: Ferramentas de desenvolvimento	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
25	#105017	Renovação Serviço: Solução de Anti-vírus	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI
26	#808285	Contratação de Serviços de Digitalização e indexação de processos de papéis de trabalho de auditoria e fiscalização da Controladorias Regionais	16.2 / 20.4 / 20.5		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	CGDOC
27	#810801	Aquisição de Dispositivos de Usuários	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	Regionais
28	#810803	Aquisição de Componentes de Infraestrutura	19.6		Gestão da infraestrutura e dos serviços de TI	DTI

## ANEXO IV - PLANO ORÇAMENTÁRIO 2019 - 2020

Esta seção apresenta a estimativa orçamentária para manutenção dos serviços de TI e para atendimento aos projetos previstos neste Plano.

Item	Estimativa de Gastos
Suporte/Atualização software	R\$ 3.235.872,33
Aquisição Software	R\$ 3.100.000,00
Suporte Técnico	R\$ 2.939.150,59
Serviço de Hospedagem/nuvem	R\$ 2.681.662,09
Aluguel Software	R\$ 2.580.935,49
Serviço de Implantação e/ou Suporte	R\$ 1.878.773,02
Desenvolvimento de sistemas	R\$ 1.812.122,30
Serviço de dados	R\$ 1.744.821,64
Aquisição de hardware	R\$ 1.134.975,00
Serviço Usuário	R\$ 941.578,64
Suporte técnico hardware	R\$ 249.205,60
Capacitação	R\$ 232.920,00
Segurança de TI	R\$ 29.535,47
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 22.561.552,17</b>
